

# 質疑回答書

令和2年5月21日

契約番号 2020000316



件名 いがまち複合施設整備工事（建築主体工事）

質 疑	回 答
1 設計書No.10・11 設計図 A-11 屋根立上りアスファルト防水部の断面詳細 図を御提示ください。	1 立ち上がり部分のみ改修し、笠木は脱着で考 えて下さい。（別添、既設図面参照）
2 設計書No.12 設計図 A-2・13・14 樹脂注入工法の項目が設計書に見当たりま せん。施工数量調査により増減が発生すると は存じますが、発注段階での想定距離数を御 提示下さい。	2 外壁調査により必要な場合は施工すること と考えています。設計書には計上しておりま せん。
3 設計書No.20 設計図 A-20・22 男女便所既設床の50角タイルは、撤去しな くてよいと解釈してよろしいでしょうか。	3 お見込みのとおりです。
4 設計図 A-34・36 客用男女便所のトイレブース変更に伴う、既 設取付ビス孔の壁タイル補修項目が設計書 に見当たりませんが、どのように御考えでし ょうか。	4 既設ビス穴の補修は、シーリング補修適度で 考えています。
5 設計書No.23・25・26・27・28 設計図 A-15・17・24・25・27 天井点検口復旧とは、既設再取付と解釈して よろしいでしょうか。	5 既設再取り付けとしてください。

※この回答に対する質問は受付できません。

D-4 二層階 後層部 外壁部

人工浮床加床。7.5.17型(2.5.17型) - 1.1.1  
 2.5.17型(2.5.17型) - 1.1.1  
 1.1.1型(2.5.17型) - 1.1.1

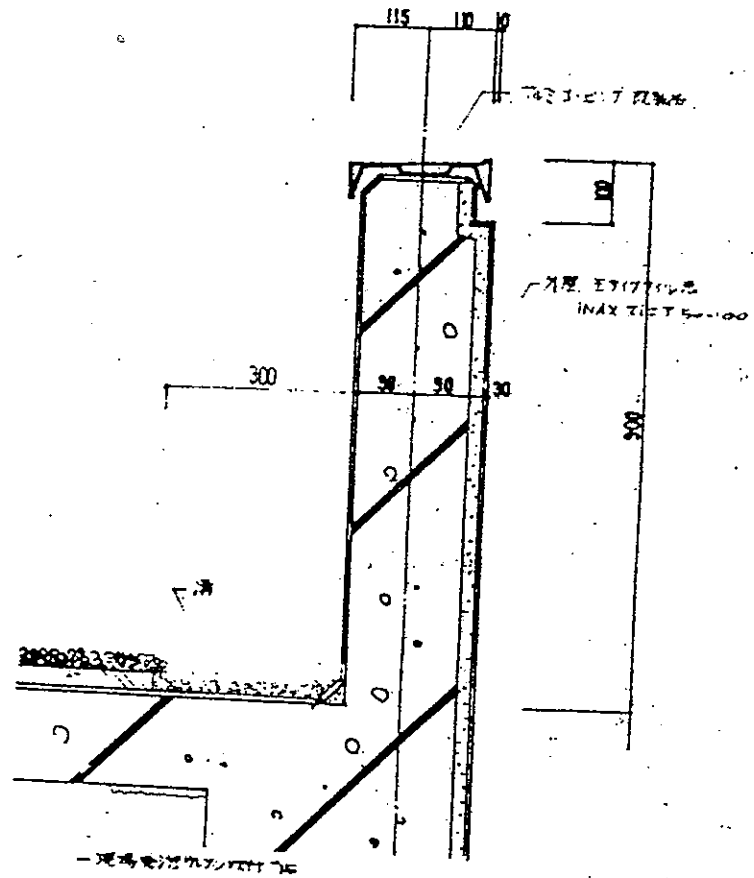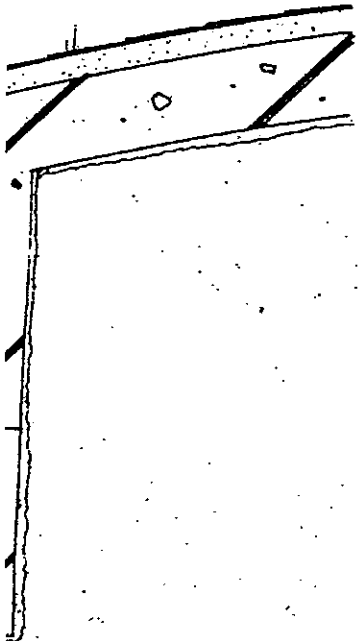

D-7 大正丸 新台 高層部 外壁部

