

伊賀市週休2日制工事試行要領



令和8年7月 改定

伊 賀 市

目 次

第1編 土木・水道工事編（積算基準(下水道編)適用工事含む）	
1. 土日完全週休2日制工事(発注者指定型)試行要領	… 1
2. 【参考】土日完全週休2日制工事確認表	… 5
第2編 公共建築工事編	
1. 土日完全週休2日制工事試行要領	… 6
2. 【参考】土日完全週休2日制工事確認表	… 10
第3編 農業農村整備工事編	
1. 土日完全週休2日制工事(発注者指定型)試行要領	… 11
2. 【参考】土日完全週休2日制工事確認表	… 15
第4編 森林整備保全工事編	
1. 土日完全週休2日制工事(発注者指定型)試行要領	… 16
2. 【参考】土日完全週休2日制工事確認表	… 26

第1編 土木・水道工事編
(積算基準(下水道編)適用工事含む)

第1編 土木工事編（積算基準（下水道編）適用工事含む）

1. 土日完全週休2日制工事（発注者指定型）試行要領

（目的）

第1条 建設業では、若年者の入職が年々減少し、将来の担い手不足が大きな課題となっている。担い手確保には、建設現場における労働環境の改善が必須であるため、伊賀市が発注する建設工事の週休2日（4週8休以上）の普及・定着に向けて土日完全週休2日制工事を試行する。

（定義）

第2条 土日完全週休2日制工事とは、工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間^{※1}として、現場閉所^{※2}を原則、すべての土曜日と日曜日に行うものをいう。

2 この要領において、通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう

※1 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く

- ・準備期間
- ・後片付け期間
- ・夏季休暇（3日間）
- ・年末年始休暇（6日間）
- ・工場製作のみの期間
- ・工事事故等による不稼働期間
- ・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間
- ・その他、受注者の責によらず休工を余儀なくされる期間

なお、発注者の指示により土日作業（同一週内での指示に限る）を行った作業日は対象期間から除く。

※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう

（対象工事）

第3条 伊賀市が発注するすべての工事の案件を対象とする。ただし、以下の案件については対象外とする。

- ① 契約工期が50日未満の工事
- ② 現場閉所困難な工事^{※3}
- ③ 発注担当課の所属長が対象工事に適さないと判断する工事

※3 現場閉所困難工事は、下記のとおりとする。

- ・ 道路・河川等の公共性のある施設の維持管理工事等、緊急性が高く休日（土日、祝日、年末年始休暇、夏季休暇）に作業が必要な工事
- ・ 社会的要請や現場条件の制約等により、現場閉所を行うことが困難な工事（交通規制、出水期、完成時期等の制約のある工事 等）
- ・ 災害復旧工事

（入札公告等への明示）

第4条 発注者は、入札公告において、「土日完全週休2日制工事（発注者指定型）経費補正なし」である旨を明示する。

（経費の計上）

第5条 週休2日に関する経費補正は行わないものとする。

- 2 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。
- 3 受注者は、月1回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。
また、工事完成時に通期の週休2日の達成状況を報告すること。

（工事成績評価における評価）

第6条 対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所が達成できた場合、工事成績採点表 創意工夫の評価（監督員）における【安全衛生 35. その他】において加点点評価する。

なお、現場見学会など、1週間以上前に判明した土日作業がある場合には、発注者との協議により土曜日・日曜日を別の日への振替えることができるが、工事成績評価の加点点対象となるのは、原則、前後2週間以内の平日へ振替えた場合とする。

また、対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所及び通期の週休2日が達成出来なかった場合でも、工事成績評価の減点は行わない。

(その他)

第7条 伊賀市が配布する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。

【掲示の例・サイズ】A3横サイズ(297×420 mm)



【入手方法】

・伊賀市HPからダウンロード

<https://www.city.iga.lg.jp/0000005725.html>

附則 この要領は、令和6年4月1日から施行する。

附則 この要領は、令和6年10月1日から施行する。

附則 この要領は、令和7年5月1日から施行する。

附則 この要領は、令和7年8月1日から施行する。

附則 この要領は、令和8年7月22日から施行する。

【別紙 通期の週休2日の考え方】

通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

通期の週休2日は、以下のとおり、月1回の現場閉所状況を確認し、工事完成時に週休2日の達成状況を確認する。

A月						
月	火	水	木	金	土	日
1	2	3 工事契日	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

A月

- ・対象期間 対象外（準備期間）
- ・現場閉所日数 対象外（準備期間）
- ・現場閉所日数/対象期間日数 対象外
- ・土日現場閉所 対象外

B月						
月	火	水	木	金	土	日
		1	2 工事着手	3	4	5
6	7	8	9 作業指示	10	11 土曜作業	12
13	14 振替え	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

B月

- ・対象期間 29日
- ・現場閉所日数 8日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
8日/29日＝27.6…NG 工期全体で評価
- ・土日現場閉所 OK（土曜作業 OK、振替え OK）

C月						
月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26 工事完成	27	28	29	30

C月

- ・対象期間 6日
- ・現場閉所日数 2日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
2日/6日＝33.3… OK
- ・土日現場閉所 OK

準備・後片付け期間

対象期間

通期（工期全体）

- ・対象期間 35日
- ・閉所日数 10日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
10日/35日＝28.6…
- ・土日現場閉所 全て OK

2.【参考】土日完全週休2日制工事確認表

土日完全週休2日制工事 確認表

工事名			
工 期		～	
工事開始日		完成報告提出日	

請負業者名	
現場代理人	

対象期間内のすべての土日を指定土日として記入する

判定

・月単位の週休2日 ・通期（対象期間全体）の週休2日 ・指定土日（成績加点）	週休2日 × × ×
--	--



監督員・現場代理人においても間違いないか確認をお願いします。

※港湾工事の通期は成績評定のみ考慮。（港湾工事の補正係数に通期の考え方は無い）

		日数	開所率	4週8休 判定	指定土日 現場閉所	成績 加減	備考
計画	対象日		0	対象外			準々準備期間、片々製作期間、夏々夏休み期間、年々年末年始の期間、 暖々工場製作期間、○々対象期間、●々閉所指定日、○々閉所予定日、 準々工事改善による不稼働期間、※々天災に対する突発的な付加期間、 他々その他、受注者の真にならぬ作業、●々閉所日
	閉所日		0	対象外			
	対象日		0	対象外			
実績	閉所日		0	対象外		-	指定々現場閉所指定日、振替々指定日の振替日、事前々事前指示 開始々工事開始日、完成々完成報告書提出日
備考							

	日数	開所率	A通8休 判定	指定土日 現場閉所	成績 加減	備考
計画	対象日	0	対象外	0	0	※工事準備期間、片々後片打期間、夏々夏休みの期間、年々年末年始休み期間、 壁工・工場製作期間、○●対象期間、●閉所指定日、○●閉所予定日
実績	対象日	0	対象外	0	0	※工事事故等による不稼働期間、※天災に対する突発的な片打期間、 他々その他の、受注者の責にやらない作業、●●閉所日
	閉所日	0	対象外	0	-	指定々現場閉所指定日、振替々指定日の振替日、事前々事前指示 開始々工事開始日、完成々完成報告書提出日
備考						

第2編 公共建築工事編

第2編 公共建築工事編

1. 土日完全週休2日制工事試行要領

（目的）

第1条 建設業では、若年者の入職が年々減少し、将来の担い手不足が大きな課題となっている。担い手確保には、建設現場における労働環境の改善が必須であるため、伊賀市が発注する建設工事の週休2日（4週8休以上）の普及・定着に向けて土日完全週休2日制工事を試行する。

（定義）

第2条 土日完全週休2日制工事とは、工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間^{※1}として、現場閉所^{※2}を原則、すべての土曜日と日曜日に行うものをいう。

2 この要領において、通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

※1 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く

- ・準備期間
- ・後片付け期間
- ・夏季休暇（3日間）
- ・年末年始休暇（6日間）
- ・工場製作のみの期間
- ・工事事故等による不稼働期間
- ・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間
- ・その他、受注者の責によらず休工を余儀なくされる期間

なお、発注者の指示により土日作業（同一週内での指示に限る）を行った作業日は対象期間から除く。

※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

なお、分離発注工事の場合は、各発注工事単位で現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態（現場休息）をもって、現場閉所の判断を行うものとする。

（対象工事）

第3条 伊賀市が発注するすべての工事の案件を対象とする。ただし、以下の案件については対象外とする。

- ① 契約工期が50日未満の工事
- ② 現場閉所困難な工事^{※3}
- ③ 発注担当課の所属長が対象工事に適さないと判断する工事

※3 現場閉所困難工事は、下記のとおりとする。

- ・ 緊急性が高く休日（土日、祝日、年末年始休暇、夏季休暇）に作業が必要な工事
- ・ 社会的要請や現場条件の制約等により、現場閉所を行うことが困難な工事（交通規制、出水期、完成時期等の制約のある工事 等）
- ・ 災害復旧工事

（入札公告等への明示）

第4条 発注者は、入札公告において、「土日完全週休2日制工事（発注者指定型）経費補正なし」である旨を明示する。

（経費の計上）

第5条 週休2日に関する経費補正は行わないものとする。

- 2 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。
- 3 受注者は、月1回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。また、工事完成時に通期の週休2日の達成状況を報告すること。

（工事成績評価における評価）

第6条 対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所が達成できた場合、工事成績採点表 創意工夫の評価（監督員）における【安全衛生 35. その他】において加点点評価する。

なお、現場見学会など、1週間以上前に判明した土日作業がある場合には、発注者との協議により土曜日・日曜日を別の日へ振替えることができるが、工事成績評価の加点点対象となるのは、原則、前後各2週間以内の平日へ振替えた場合とする。

また、対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所及び通期の週休2日が達成できなかった場合でも、工事成績評価の減点は行わない。

(その他)

第7条 伊賀市が配布する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。

【掲示の例・サイズ】A3横サイズ(297×420 mm)



【入手方法】

・伊賀市HPからダウンロード

<https://www.city.iga.lg.jp/0000005725.html>

附則 この要領は、令和6年4月1日から施行する。

附則 この要領は、令和6年10月1日から施行する。

附則 この要領は、令和7年8月1日から施行する。

附則 この要領は、令和8年7月22日から施行する。

【別紙 通期の週休2日の考え方】

通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が、4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数=28.5%以上）であることをいう。

通期の週休2日は、以下のとおり、月1回の現場閉所を確認し、工事完成時に週休2日の達成状況を確認する。

A月						
月	火	水	木	金	土	日
1	2	3 工事契日	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

A月

- ・対象期間 対象外（準備期間）
- ・現場閉所日数 対象外（準備期間）
- ・現場閉所日数/対象期間日数 対象外
- ・土日現場閉所 対象外

B月						
月	火	水	木	金	土	日
		1 工事着手	2	3	4	5
6	7	8	9 作業指示	10	11 土曜作業	12
13	14 振替え	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

B月

- ・対象期間 29日
- ・現場閉所日数 8日
- ・現場閉所日数/対象期間日数 8日/29日=27.6...NG 工期全体で評価
- ・土日現場閉所 OK（土曜作業 OK、振替え OK）

C月						
月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26 工事完成	27	28	29	30

C月

- ・対象期間 6日
- ・現場閉所日数 2日
- ・現場閉所日数/対象期間日数 2日/6日=33.3... OK
- ・土日現場閉所 OK

準備・後片付け期間
対象期間

通期（工期全体）

- ・対象期間 35日
- ・閉所日数 10日
- ・現場閉所日数/対象期間日数 10日/35日=28.6... OK
- ・土日現場閉所 全て OK

監督員・現場代理人においても間違いないか確認をお願いします。

※港湾工事の通期は成績評定のみ考慮。（港湾工事の補正係数に通期の考え方は無い）

工欄 工基		2	
工欄 工基		完成報告書	

請負業者名	
票據代理人	

対象期間内のすべての土日を指定土日として記入する

・ 田舎村 S 編み 2 田	×
・ 田舎 (五ヶ所田舎村) S 編み 2 田	×
・ 田舎村 (五ヶ所田舎村)	×

監督員・現場代理人においても間違いがないか確認をお願いします。

※港灣工事の通期は成績評定のみ考慮。(港灣工事の補正係数に通期の考え方は無い)

[illegible]

指定土地	対象外
------	-----

[illegible][illegible]+
D

宝来



附所

1000

● 合江縣志

成規

...

● 合 3 年 III

第五十四回

三

船政工程船政III、完長中完長聚紅曲誤丑III

第3編 農業農村整備工事編

第1編 農業農村整備工事編

1. 土日完全週休2日制工事（発注者指定型）試行要領

（目的）

第1条 建設業では、若年者の入職が年々減少し、将来の担い手不足が大きな課題となっている。担い手確保には、建設現場における労働環境の改善が必須であるため、伊賀市が発注する建設工事の週休2日（4週8休以上）の普及・定着に向けて土日完全週休2日制工事を試行する。

（定義）

第2条 土日完全週休2日制工事とは、工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※1として、現場閉所※2を原則、すべての土曜日と日曜日に行うものをいう。

2 この要領において、通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上（現場閉所日数/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

※1 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く

- ・準備期間
- ・後片付け期間
- ・夏季休暇（3日間）
- ・年末年始休暇（6日間）
- ・工場製作のみの期間
- ・工事事故等による不稼働期間
- ・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間
- ・その他、受注者の責によらず休工を余儀なくされる期間

なお、発注者の指示により土日作業（同一週内での指示に限る）を行った作業日は対象期間から除く。

※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

（対象工事）

第3条 伊賀市が発注するすべての工事の案件を対象とする。ただし、以下の案

件については対象外とする。

- ① 契約工期が、50日未満の工事
- ② 現場閉所困難な工事※3
- ③ 発注担当課の所属長が対象工事に適さないと判断する工事

※3 現場閉所困難な工事は、下記のとおりとする。

- ・ 道路・河川等の公共性のある施設の維持管理工事等、緊急性が高く休日（土日、祝日、年末年始休暇、夏季休暇）に作業が必要な工事
- ・ 社会的要請や現場条件の制約等により、現場閉所を行うことが困難な工事（交通規制、出水期、完成時期等の制約のある工事 等）
- ・ 災害復旧工事

（入札公告等への明示）

第4条 発注者は、入札公告において、「土日完全週休2日制工事（発注者指定型）経費補正なし」である旨を明示する。

（経費の計上）

第5条 週休2日に関する経費補正は行わないものとする。

2 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。

3 受注者は、月1回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。また、工事完成時に通期の週休2日の達成状況を報告すること。

（工事成績評価における評価）

第6条 対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所が達成できた場合、工事成績採点表 創意工夫の評価（監督員）における【安全衛生 35. その他】において加点点評価する。


なお、緊急対応など、やむを得ない理由がある場合には、発注者との協議により土曜日・日曜日を別の日へ振替えることができるが、工事成績評価の加点点対象となるのは、原則、前後2週間以内の平日への振替えた場合とする。

また、対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所及び通期の週休2日が達成出来なかった場合でも、工事成績評価の減点は行わない。

(その他)

第7条 伊賀市が配布する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。

【掲示の例・サイズ】A3横サイズ(297×420 mm)

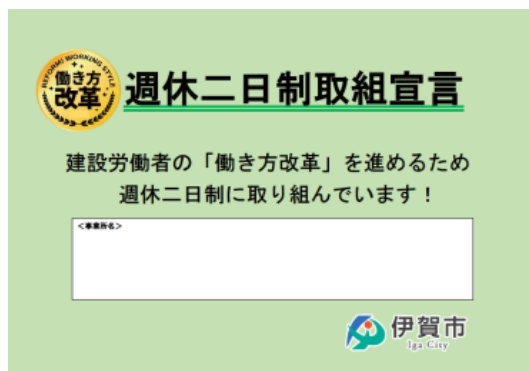

【入手方法】

・伊賀市HPからダウンロード

<https://www.city.iga.lg.jp/0000005725.html>

附則 この要領は、令和6年10月1日から施行する。

附則 この要領は、令和7年8月1日から施行する。

附則 この要領は、令和8年7月22日から施行する。

【別紙 通期の週休2日の考え方】

通期の週休2日とは、対象期間全体での現場閉所の達成状況が4週8休以上（現場閉所日/対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

通期の週休2日は、以下のとおり、月1回の現場閉所状況を確認し、工事完成時に週休2日の達成状況を確認する。

A月						
月	火	水	木	金	土	日
1	2	3 工事契日	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

A月

- ・対象期間 対象外（準備期間）
- ・現場閉所日数 対象外（準備期間）
- ・現場閉所日数/対象期間日数 対象外
- ・土日現場閉所 対象外

B月						
月	火	水	木	金	土	日
		1	2 工事着手	3	4	5
6	7	8	9 作業指示	10	11 土曜作業	12
13	14 振替え	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

B月

- ・対象期間 29日
- ・現場閉所日数 8日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
8日/29日＝27.6…NG 工期全体で評価
- ・土日現場閉所 OK（土曜作業OK、振替えOK）

C月						
月	火	水	木	金	土	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26 工事完成	27	28	29	30

C月

- ・対象期間 6日
- ・現場閉所日数 2日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
2日/6日＝33.3… OK
- ・土日現場閉所 OK

準備・後片付け期間
対象期間

通期（工期全体）

- ・対象期間 35日
- ・閉所日数 10日
- ・現場閉所日数/対象期間日数
10日/35日＝28.6…
- ・土日現場閉所 全てOK

15

第4編 森林整備保全工事編

第2編 森林整備保全工事編

1. 土日完全週休2日制工事（発注者指定型）試行要領

（目的）

第1条 建設業では、若年者の入職が年々減少し、将来の担い手不足が大きな課題となっている。担い手確保には、建設現場における労働環境の改善が必須であるため、伊賀市が発注する建設工事の週休2日（4週8休）の普及に向けて土日完全週休2日制工事を試行する。

（定義）

第2条 土日完全週休2日制工事（以下「週休2日」という。）とは、工事開始日から工事完成報告書の提出日までを対象期間※1として、現場閉所※2を原則、すべての土曜日と日曜日に行うものをいう。

2 この要領において、週単位の週休2日とは、対象期間内のすべての週における現場閉所の達成状況が、1週間（月曜日から日曜日まで）のうち2日間以上であることをいう。（別紙2）

3 この要領において、月単位の週休2日とは、対象期間内のすべての月毎における現場閉所の達成状況が4週8休以上（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

なお、暦上の土曜日・日曜日の現場閉所でも4週8休（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5%）に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている場合に、4週8休以上（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5%以上）を達成しているものとみなす。（別紙3の①）

※1 対象期間の考え方について、以下の期間は対象期間から除く。

- ・準備期間
- ・後片付け期間
- ・夏季休暇（3日間）
- ・年末年始休暇（6日間）
- ・工場製作のみの期間
- ・工事事故等による不稼働期間
- ・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間
- ・その他、受注者の責によらず休工を余儀なくされる期間

なお、週単位の週休2日の場合において、対象となる週が1週間（月曜日から日曜日）に満たない週、発注者の指示による土日作業（同一週内での指示に限る）を行った週は対象期間から除く。（別紙2の①、②）

また、月単位の週休2日の場合において発注者の指示による土日作業（同一週内での指示に限る）を行った日、暦上の土曜日・日曜日が対象期間に含まれない月は対象期間から除く。（別紙3の②、③）

※2 巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

（対象工事）

第3条 伊賀市が発注するすべての工事の案件を対象とする。ただし、以下の案件については対象外とする。

- ① 契約工期が、50日未満の工事
- ② 現場閉所困難な工事※3
- ③ 発注担当課の所属長が対象工事に適さないと判断する工事

※3 現場閉所困難工事は、下記のとおりとする。

- ・道路・河川等の公共性のある施設の維持管理工事等、緊急性が高く休日（土日、祝日、年末年始休暇、夏季休暇）に作業が必要な工事
- ・社会的要請や現場条件の制約等により、現場閉所を行うことが困難な工事（交通規制、出水期、完成時期等の制約のある工事等）
- ・災害復旧工事

（入札公告等への明示）

第4条 発注者は、入札公告において、「土日完全週休2日制工事（発注者指定型（経費補正あり）（週単位））」である旨を明示する。

（経費の計上）

第5条 当初設計における週休2日に関する経費は、週単位の週休2日の現場閉所を前提とした補正係数（別紙1の①、③、④）を乗じたそれぞれの経費（労務費、共通仮設費率、現場管理費率、市場単価、標準単価）を計上するものとする。

2 受注者は、週単位の週休2日に取り組むことを希望するかについて、工事着手前に発注者へ様式1により報告するものとする。

取組を希望しない場合は、月単位の週休2日に取り組むものとする。

3 工事の精算にあたり、週単位の週休2日に取り組むことを希望しない場合、または、週単位の週休2日は達成できなかったものの、月単位の週休2日を達成した場合は、月単位の補正係数（別紙1の②、③、④）に減額変更するものとする。

また、月単位の週休2日を達成できなかったものについては、補正分を減額変更するものとする。

4 算定する現場閉所日数は、土曜日・日曜日にかかわらず現場を閉所した日の累計とし、荒天（降雨・降雪等）により休工した日も現場を閉所した日数に含めるものとする。

なお、週休2日の算定においては実際に現場閉所した日を週または月単位で算定すること。

5 受注者は、月1回、工事現場の休工状況を監督員に報告すること。

（工事成績評定における評価）

第6条 対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所が達成できた場合、工事成績採点表 創意工夫の評価（監督員）における【安全衛生 35. その他】において加点評価する。

なお、現場見学会など、1週間以上前に判明した土日作業がある場合には、発注者との協議により土曜日・日曜日を別の日に振替えることができるが、工事成績評定の加点対象となるのは、原則、前後2週間以内の平日への振替えの場合とする。（別紙2の③、別紙3の④）

また、対象期間内ですべての土曜日・日曜日の現場閉所、週単位及び月単位の週休2日が達成出来なかった場合でも、工事成績評定の減点はない。

（その他）

第7条 伊賀市が配布する「週休二日制取組宣言」を工事現場の公衆の見やすいところに掲示するよう努める。

【掲示の例・サイズ】A3横サイズ(297×420mm)



【入手方法】

・伊賀市HPからダウンロード

<https://www.city.iga.lg.jp/0000005725.html>

附則 この要領は、令和6年10月1日から施行する。

附則 この要領は、令和7年8月1日から施行する。

附則 この要領は、令和8年7月22日から施行する。

【別紙1 補正係数】

① 週単位の週休2日（4週8休以上）

- ・ 労務費 : 1.02
- ・ 共通仮設費率 : 1.02
- ・ 現場管理費率 : 1.03

② 月単位の週休2日（4週8休以上）

- ・ 労務費 : 1.02
- ・ 共通仮設費率 : 1.01
- ・ 現場管理費率 : 1.02

森林整備保全工事

③ 市場単価方式による週休2日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	補正係数	
		週単位	月単位
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.02
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.01
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
道路標識設置工	設置	1.00	1.00
	撤去・移設	1.01	1.01
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02
法面工		1.01	1.01
吹付砕工		1.01	1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.01
橋梁用伸縮接手装置設置工		1.01	1.01
橋梁用埋設型伸縮接手装置設置工		1.02	1.02

④ 土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上に関する
補正係数

名称	区分	補正係数	
		週単位	月単位
区画線工		1.02	1.02
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.01
	人力	1.02	1.02
コンクリートブロック積工		1.02	1.02
排水構造物工		1.02	1.02
橋梁塗装工		1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.02
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
侵食防止用植生マット工(養生マット工)		1.02	1.02
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管） 設置工		1.02	1.02

【別紙2 週単位の週休2日の考え方】

週単位の週休2日とは、対象期間内のすべての週における現場閉所の達成状況が、1週間（月曜日から日曜日まで）のうち2日間以上であることをいう。

週単位の週休2日の達成状況については、以下のとおり判断し、対象期間全ての週毎の達成状況を確認したうえ、その達成状況に応じて、経費補正を評価する

① 準備期間や片付期間が含まれる場合

月	火	水	木	金	土	日
準備期間 (対象外)		対象期間 →			現場閉所	現場閉所

●週単位の達成状況：この週は対象外（対象期間が1週間未満）

■工事成績評定の加点：達成（土・日曜日の現場閉所）

月	火	水	木	金	土	日
			対象期間 ←	片付期間 (対象外)		

●週単位の達成状況：この週は対象外（対象期間が1週間未満）

■工事成績評定の加点：対象外（対象期間に土・日曜日を含まない）

② 同一週内での指示による土日作業（緊急対応等）を行った場合

月	火	水	木	金	土	日
指示日					緊急対応	現場閉所

●週単位の達成状況：この週は対象外（緊急対応のため）※1

■工事成績評定の加点：達成（緊急対応により土曜日が対象外）※2

※1 週単位において、発注者の指示による土日作業（同一週内での指示に限る）を行った週は、対象期間から除く。

※2 工事成績評定において、発注者の指示による土日作業（同一週内での指示に限る）を行った日は、対象期間から除く。

- ③ 1週間以上前に判明した土日作業（現場見学会等）を前後2週間以内の平日に振替えた場合

月	火	水	木	金	土	日	
	指示日		現場閉所			現場閉所	第A週
						現場閉所	第B週

振替え

第A週

●週単位の達成状況 : 達成（1週間で2日の現場閉所）

■工事成績評定の加点 : 未達成（土曜日に現場作業）

第B週

●週単位の達成状況 : 未達成（1週間で1日の現場閉所）※3

■工事成績評定の加点 : 達成（振替えによる土・日曜日の現場閉所）

※3 発注者の指示による土日作業は原則、現場閉所日を前後2週間以内の平日に振替えるものとするが、週をまたぐ振替えについては、振替えた先の週における現場閉所日として扱うものとする。

【別紙3 月単位の週休2日の考え方】

月単位の週休2日とは、対象期間内のすべての月毎における現場閉所の達成状況が4週8休以上（各月の現場閉所日数/各月の対象期間日数＝28.5%以上）であることをいう。

なお、下記①の場合も4週8休以上達成とみなす。

- ① 暦上の土曜日・日曜日の現場閉所でも4週8休に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に現場閉所を行っている場合に、4週8休以上を達成しているものとみなす。（A月、B月）

A月（パターンA）						
月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

- ・ A月すべてが対象期間の場合

$$\frac{8 \text{ 日（土日日数）}}{30 \text{ 日（対象日数）}} = 26.66 \dots$$

4週8休に満たないが、A月は8日以上
の現場閉所で4週8休以上達成とみなす

B月（パターンB）						
月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

- ・ B月22日から対象期間が始まる場合

$$\frac{2 \text{ 日（土日日数）}}{9 \text{ 日（対象日数）}} = 22.22 \dots$$

4週8休に満たないが、B月は2日以上
の現場閉所で4週8休以上達成とみなす

- ② 暦上の土曜日・日曜日が対象期間に含まれない月は対象期間から除く。
（C月）

C月（パターンC）						
月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

- ・ C月4日で対象期間が終わる場合
- ・ C月29日から対象期間が始まる場合



暦上の土日を含まないため、対象期間から除く

③ 同一週での指示による土日作業は対象期間から除く。

D月（パターンD）						
月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16 指示日	17	18	19	20 緊急対応	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

・ D月16日の指示でD月20日に緊急対応を行った場合



緊急対応の作業日を除いた土日日数の現場閉所を行っていれば、4週8休以上の達成とみなす

土日日数8日 ⇒ 土日日数7日
緊急対応除く

※ 月単位及び工事成績評定において、発注者の指示による土日作業（同一週内での指示に限る）を行った日は、対象期間から除く。

④ 土曜日・日曜日をやむを得ず振替える場合（E月、F月）

【同じ月への振り替え】							【他の月への振り替え】						
E月							F月						
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
29	30						29	30					

・ E月の現場閉所日としてみなす

・ F月の現場閉所日としてみなす
（E月の現場閉所日としない）

※ E月の4週8休以上の率算出時に注意

【工事成績評定の加算】

振替え対象となる土曜日・日曜日から、原則、前後2週間以内の平日への振替えの場合とする。

2.【参考 土日完全週休2日制工事確認表】

土日完全週休2日制工事 月単位確認表

請食業者名	
現場代理人	

対象期間内のすべての土日を指定土日
として記入する

判定

監督員・現場代理人においても間違いがないか確認をお願いします。
※通期で達成しても、補正なしに減額変更となるので注意。

監督員・現場代理人においても間違いがないか確認をお願いします。
※通期で達成しても、補正なしに減額変更となるので注意。

事前指示における振替日

事前指示対応日	振替日	判定

												日付	課名	依頼内容 依頼開始日	決定日 依頼開始日	経過 状況	備考
計画	計画項目											日	課名	依頼内容 依頼開始日	決定日 依頼開始日	経過 状況	備考
	計画項目											日	課名	依頼内容 依頼開始日	決定日 依頼開始日	経過 状況	
実施	実施項目											日	課名	依頼内容 依頼開始日	決定日 依頼開始日	経過 状況	備考
	実施項目											日	課名	依頼内容 依頼開始日	決定日 依頼開始日	経過 状況	
備考																	担当＝依頼開始日決定日、依頼＝決定日の前日付、備考＝依頼開始日 開始日＝工事開始日、完成＝完成業務日

[illegible][illegible]

土日完全週休 2 日制工事 週単位確認表

対象	0週	達成	0週
----	----	----	----

土日の振替日を入力

土曜 日曜

判定(経費補正) 判定(工事成績加点)

$\bigcirc$	$\times$
------------	----------

対象外	×
-----	---

対象外	×
-----	---

対象外	×
-----	---

対象外	×
-----	---

対象外	×
-----	---

対象外	×
-----	---

対象外	×
-----	---

対象外	×
-----	---

対象外	×
-----	---

対象外	×
-----	---

様式1

土日完全週休2日制工事（発注者指定型（経費補正あり）（週単位））

週単位の週休2日の実施について

以下のいずれかを■にしてください。

☐：当社は週単位の週休2日を実施します。

☐：当社は週単位の週休2日を実施せず、月単位の週休2日に取り組みます。

令和 年 月 日

工事名 _____

会社名 _____

現場代理人 _____
